

# REGISTRO DE AVANCE DE ACUICULTURA DEL 4TO TRIMESTRE

Monto Global Aprobado

\$16,029,761.00

+ Agregar Fuente de Financiamiento

Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Programa Estatal o Municipal	Aprobado	Modificado	Acción
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		\$16,029,761.00	\$16,029,761.00	<a href="#">✖ Eliminar</a>

Avance Financiero

+ Registrar Avance

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2020 / OCT-DIC	\$16,029,761.00	\$16,029,761.00	\$16,029,761.00	\$16,029,761.00	\$16,029,761.00	100%	<a href="#">✎ Editar</a>
2020 / JUL-SEP	\$8,976,666.00	\$16,029,761.00	\$3,201,669.82	\$3,201,669.82	\$3,201,669.82	19.97%	✓ Confirmado
2020 / ABR-JUN	\$6,011,161.00	\$15,260,217.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	✓ Confirmado

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos
100.00 %

Unidad de Medida

Meta

Meta Modificada

+ Registrar Avance

Metros Cuadrados

1565.65

1565.65

✎

Porcentaje Total de la Meta
100.00%

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2020 OCT-DIC	1565.65	100%	<a href="#">✎ Editar</a>
2020 JUL-SEP	312.8	19.98%	✓ Confirmado
2020 ABR-JUN	0	0.00%	✓ Confirmado

✖ Cancelar

← Anterior

Guardar y Continuar →

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Versión 1.0

UMAR x Acta\_de\_fallo\_y x (5) WhatsApp x ENTRADA: 366 x Contrato\_001\_ x Contrato\_001\_ x .Seguimiento x UMAR x

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1707753

Aplicaciones Sistema de Integrac... Portal Aplicativo de... IAP Oaxaca Sistema Estatal de F... UMAR Transparencia Pres... https://www.platafo... https://www.mst.ha...

Eliminar Eliminar

Termino

Eliminar Eliminar Eliminar

Cancelar Anterior Guardar y Continuar

ES 05:29 p.m. 15/01/2021

UMAR x Acta\_de\_fallo\_y x (5) WhatsApp x ENTRADA: 366 x Contrato\_001\_ x Contrato\_001\_ x .Seguimiento x UMAR x

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1707753

Aplicaciones Sistema de Integrac... Portal Aplicativo de... IAP Oaxaca Sistema Estatal de F... UMAR Transparencia Pres... https://www.platafo... https://www.mst.ha...

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto Inicio > Registros de Avances Individual de Proyectos


¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.


FOLIO DEL REGISTRO  
**OAX200201707753**

Cancelar Anterior Solicitar Validación Solicita Suspensión

ES 05:29 p.m. 15/01/2021



TERMINACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE ACUICULTURA 4TO TRIMESTRE

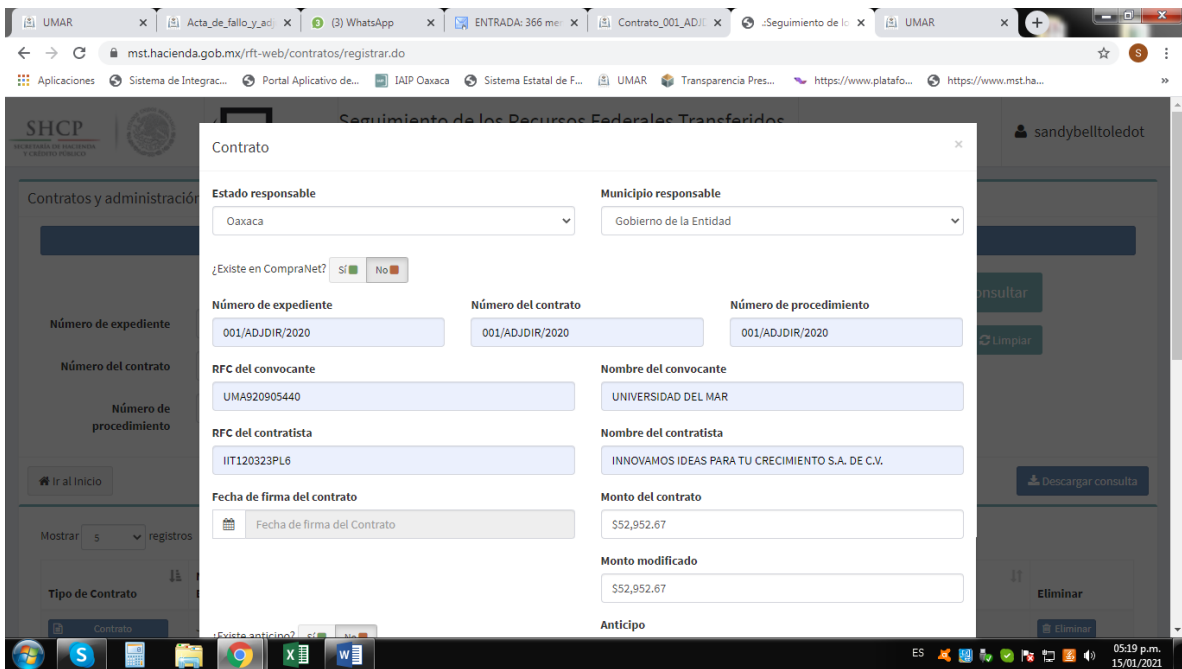

UMAR x Acta\_de\_fallo\_y x (3) WhatsApp x ENTRADA: 366 x Contrato\_001\_ x Contrato\_001\_ x .Seguimiento x UMAR x

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/contratos/registrar.do

Aplicaciones Sistema de Integrac... Portal Aplicativo de... IAIP Oaxaca Sistema Estatal de F... UMAR Transparencia Pres... https://www.platafo... https://www.mst.ha...

### SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

## Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

sandybelltoledot

### Contrato

Estado responsable: Oaxaca Municipio responsable: Gobierno de la Entidad

¿Existe en CompraNet?  Sí  No

Número de expediente: 001/ADJDIR/2020 Número del contrato: 001/ADJDIR/2020 Número de procedimiento: 001/ADJDIR/2020

RFC del convocante: UMA920905440 Nombre del convocante: UNIVERSIDAD DEL MAR

RFC del contratista: IIT120323PL6 Nombre del contratista: INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO S.A. DE C.V.

Fecha de firma del contrato: Fecha de firma del Contrato

Monto del contrato: \$52,952.66

Monto modificado: \$52,952.66

Anticipo

Ir al Inicio

Mostrar 5 registros

Tipo de Contrato

ES 05:22 p.m. 15/01/2021

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/contratos/registrar.do

Aplicaciones Sistema de Integrac... Portal Aplicativo de... IAIP Oaxaca Sistema Estatal de F... UMAR Transparencia Pres... https://www.platafo... https://www.mst.ha...

### SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

## Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

sandybelltoledot

### Contrato

Tipo de contratación: Obra Modalidad de contratación: Adjudicación directa

Fecha de conclusión según el contrato: Fecha de conclusión según el contrato

Descripción del contrato: TERMINACION DE LA RECONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA LABORATORIOS DE ACUICULTURA EN EL CAMPUS PUERTO ANGEL

Número de expediente: 295

Liga del contrato: http://www.umar.mx/licitaciones/2020/E1/Contrato\_001\_ADJDIR\_2020.pdf

Estatus del contrato: Contrato vigente Fecha de conclusión: Fecha de conclusión

Liga documento de evidencia: URL del documento de evidencia de término

Cerrar Agregar

Ir al Inicio

Mostrar 5 registros

Tipo de Contrato

J03-122-02-03-Excel 2013 03-122-02-05-333- AD-SINFRA/SSOP/UL- ADRIEL VASQUEZ MAYA GOBIERNO DEL ESTADO DE S1,131,621.01

ES 05:22 p.m. 15/01/2021

UMAR x Acta\_de\_fallo\_y x (3) WhatsApp x ENTRADA: 366 x Contrato\_001\_ x Contrato\_001\_ x .Seguimiento x UMAR x

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/contratos/registrar.do

Aplicaciones Sistema de Integrac... Portal Aplicativo de... IAIP Oaxaca Sistema Estatal de F... UMAR Transparencia Pres... https://www.platafo... https://www.mst.ha...

SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

Contratos y administración

30/12/2020 \$52,952.66

Monto modificado \$52,952.66

¿Existe anticipo?  Sí  No

Tipo de contratación Obra

Modalidad de contratación Adjudicación directa

Fecha de conclusión según el contrato 31/12/2020

Descripción del contrato

TERMINACION DE LA RECONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA LABORATORIOS DE ACUICULTURA EN EL CAMPUS PUERTO ANGEL

295

Liga del contrato http://www.umar.mx/licitaciones/2020/E1/Contrato\_001\_ADJDIR\_2020.pdf

Estatus del contrato Contrato vigente

Fecha de conclusión Fecha de conclusión

Eliminar

05:24 p.m. 15/01/2021

UMAR x Acta\_de\_fallo\_y x (3) WhatsApp x ENTRADA: 366 x Contrato\_001\_ x Contrato\_001\_ x .Seguimiento x UMAR x

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/contratos/registrar.do

Aplicaciones Sistema de Integrac... Portal Aplicativo de... IAIP Oaxaca Sistema Estatal de F... UMAR Transparencia Pres... https://www.platafo... https://www.mst.ha...

SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

Contratos y administración

El contrato se guardó de manera exitosa

Número de expediente: 001/ADJDIR/2020  
Número de contrato: 001/ADJDIR/2020  
Número de procedimiento: 001/ADJDIR/2020

Aceptar

Filtro

Número de expediente Número de expediente

Número del contrato Número del contrato

Número de procedimiento Número de procedimiento

Filtro por tipo

Contrato

Administración Directa

Consultar

Limpiar

Descargar consulta

Mostrar 5 registros

Tipo de Contrato	Número de Expediente	Número de Contrato	Número de Procedimiento	Contratista	Convocante	Monto	Eliminar
Contrato	J03-122-02-05-333-	J03-122-02-05-333-	AD-SINFRA/SSOP/UL-	ADRIEL VASQUEZ MAYA	GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$1,131,621.01	Eliminar

05:24 p.m. 15/01/2021

**Monto Global Aprobado**

\$52,952.66

Agregar Fuente de Financiamiento

Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Programa Estatal o Municipal	Aprobado	Modificado	Acción
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		\$52,952.66	\$52,952.00	Eliminar

**Categoría del registro**

Acción
  Adquisición
  Proyecto de inversión

Completado

**Detalles del registro**

**Nombre**

TERMINACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA LABORATORIOS DE ACUICULTURA EN I

**Institución Ejecutora**


UNIVERSIDAD DEL MAR

**Tipo de Programa o Proyecto**

Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

**Entidad Federativa Responsable**

Oaxaca



TERMINACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA LABORATORIOS DE ACUICULTURA EN I

UNIVERSIDAD DEL MAR

**Tipo de Programa o Proyecto**  
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

**Entidad Federativa Responsable**  
Oaxaca

**Clasificación del registro**  
Educación

**Municipio Responsable**  
Gobierno de la Entidad

**Subclasificación del registro**  
Sin identificar

**Población Beneficiada**  
¿Es posible identificar población beneficiaria por hombres y mujeres?  Sí  No

**Periodo de ejecución**

**Mujeres**  
213

**Hombres**  
156

**Número de Registro**  
001/ADJDIR/2020

**Metas**

Agregar

Unidad de Medida	Meta	Editar	Eliminar
Metros Cuadrados	4.7	Editar	Eliminar



mst.hacienda.gob.mx/rft-web/proyectos/registro.do

Aplicaciones Sistema de Integrac... Portal Aplicativo de... IAIP Oaxaca Sistema Estatal de F... UMAR Transparencia Pres... https://www.platafo... https://www.mst.ha...

**+ Agregar**

Unidad de Medida	Meta	Editar	Eliminar
Metros Cuadrados	4.7	<a href="#">Editar</a>	<a href="#">Eliminar</a>

**Geolocalización**

Tipo de Georreferencia  
 Punto(s) Independ

[Agregar georreferencia](#)

Estado	Municipio	Localidad	Dirección	Latitud / Longitud	Eliminar
Oaxaca	San Pedro Pochutla	Puerto Ángel	Ciudad Universitaria, Puerto Ángel,, 70902 Oaxaca, México	15.66287489/-96.50060177	<a href="#">Eliminar</a>

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/proyectos/registro.do

Aplicaciones Sistema de Integrac... Portal Aplicativo de... IAIP Oaxaca Sistema Estatal de F... UMAR Transparencia Pres... https://www.platafo... https://www.mst.ha...

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
No se han registrado avances financieros.							

**Avances Físicos**

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **100.00 %**

Unidad de Medida: Metros Cuadrados      Meta: 4.7      [Registrar Avance](#)

Porcentaje Total de la Meta **100.00%**

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2020 OCT-DIC	4.7	100%	<a href="#">Editar</a>

[Inicio](#)   [Anterior](#)   [Guardar y Continuar](#)

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Versión 1.0

Avance Financiero

Recaudado: \$52,952.66 ✓

Comprometido: \$52,952.66 ✓

Devengado: \$52,952.66 ✓

Ejercido: \$52,952.66 ✓

Pagado: \$52,952.66 ✓

Cancelar Aceptar

Inicio ← Anterior Guardar y Continuar →

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2020 / OCT-DIC	\$52,952.66	\$52,952.66	\$52,952.66	\$52,952.66	\$52,952.66	100%	<a href="#">Editar</a>

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos: **100.00 %**

Unidad de Medida: Metros Cuadrados      Meta: 4.7      [Registrar Avance](#)

Porcentaje Total de la Meta: **100.00%**

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2020 OCT-DIC	4.7	100%	<a href="#">Editar</a>

Inicio ← Anterior Guardar y Continuar →


SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Versión 1.0



Seguimiento de los Recursos Fe x

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/registroIncompleto.do?proposito=1882102

Aplicaciones Sistema de Integrac... Portal Aplicativo de... IAIP Oaxaca Sistema Estatal de F... UMAR Transparencia Pres... https://www.platafo... https://www.mst.ha...



Eliminar

Eliminar

Termino

Cancelar Anterior Guardar y Continuar


Seguimiento de los Recursos Fe x

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/registroIncompleto.do?proposito=1882102

Aplicaciones Sistema de Integrac... Portal Aplicativo de... IAIP Oaxaca Sistema Estatal de F... UMAR Transparencia Pres... https://www.platafo... https://www.mst.ha...

### Registro Incompleto

Propósito del Gasto Inicio Registro Incompleto



¡Registro Exitoso!

Haz completado satisfactoriamente el registro. Ahora puedes solicitar su validación.

FOLIO DEL REGISTRO  
**TMP\_OAX200401882102**

Cancelar Anterior Solicitar validación

08:04 p.m. 15/01/2021
